



Financira  
Evropska unija  
NextGenerationEU



NAČRT ZA  
OKREVANJE  
IN ODPORNOST




# Z EVROPSKIMI SREDSTVI KREPIMO DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE

Anže Vilman, Elektro Gorenjska

Andrej Koren, Elektro Primorska

LJUBLJANA 03/04/2025

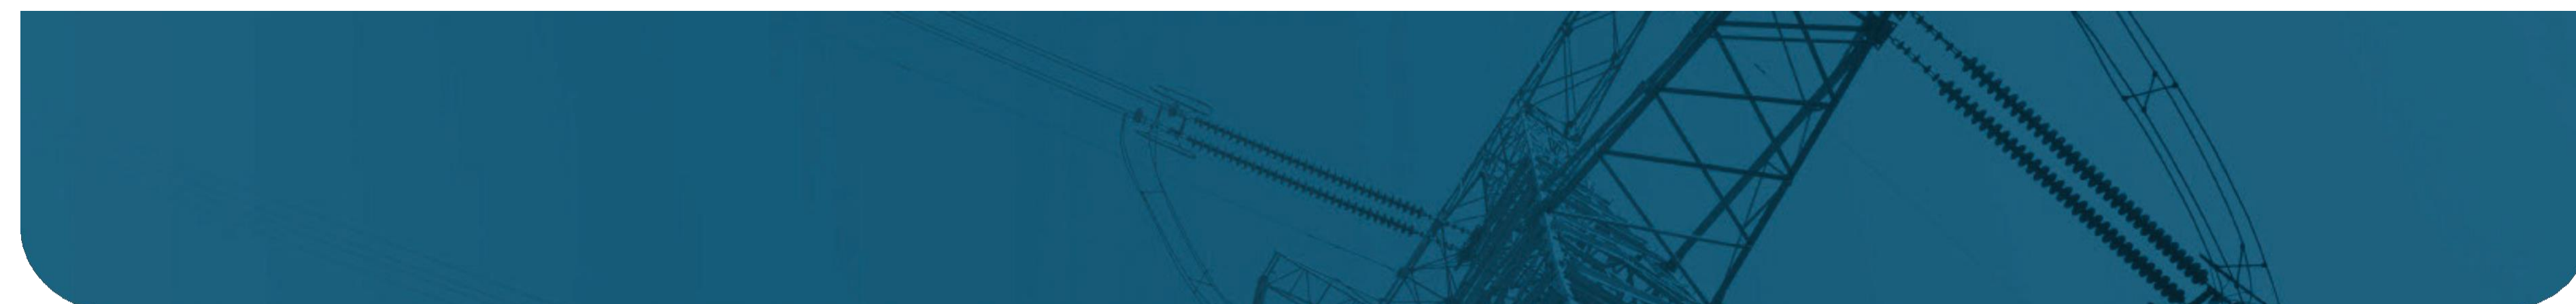



# NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

# 1.0



Financira  
Evropska unija  
NextGenerationEU



NAČRT ZA  
OKREVANJE  
IN ODPORNOST





## / ZELENİ PREHOD

- Komponenta C1K1 Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije
- Nadgradnja distribucijskega sistema z novimi in rekonstruiranimi TP z vključenimi elementi pametnega omrežja ter izgradnja novega nizkonapetostnega omrežja
- Namen – priklop proizvodnih naprav (OVE), toplotnih črpalk in polnilnih mest za e-mobilnost
- Višina sredstev – 80.000.000 €

## / REPowerEU

- Komponenta C5K17 REPowerEU
- Krepitev distribucijskega srednje napetostnega omrežja električne energije
- Namen – priklop proizvodnih naprav (OVE), toplotnih črpalk, polnilnih mest za e-mobilnost ter hranilnikov električne energije
- Višina sredstev – 20.000.000 €



# ZELENI PREHOD 2.0



Financira  
Evropska unija  
NextGenerationEU



NAČRT ZA  
OKREVANJE  
IN ODPORNOST





## / JR NOO DIST EE 2023 - MEJNIKI

- Uspešna prijava vseh EDP na prvi razpis do 30.6.2023
- Uspešna ponovna prijava dveh EDP do 6.10.2023 zaradi prilagoditve načrtov avgustovskim izrednim razmeram (poplave 2023)
- Podpis pogodb posameznih EDP za prvi razpis z Ministrstvom za okolje, energijo in podnebje v mesecu marcu 2024

# / JR NOO DIST EE 2023

- Višina dodeljenih sredstev za prvi razpis – 37.492.727 €
- Mejniki za izpolnitev pogodbe je izgradnja upravičenih enot do 31.3.2026

EDP	NNO [km]	TP 250 kVA [kos]	TP 400 do 630 kVA [kos]	TP 1000 kVA [kos]	Vrednost sofinanciranja
EL MB	94,00	23	23	15	4.770.112 €
EL LJ	288,70	74	71	41	13.865.216 €
EL CE	200,53	41	56	32	10.205.613 €
EL GO	86,70	1	52	2	4.151.473 €
EL PR	91,00	19	30	10	4.500.313 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>760,93</b>	<b>158</b>	<b>232</b>	<b>100</b>	<b>37.492.727 €</b>

zagotovljena sredstva razpisa JR NOO DIST EE 2023

# / JR NOO DIST EE 2023 – REALIZACIJA

- V letu 2024 smo prejeli tri izplačila
- 17.3.2025 smo uspešno oddali prvo vlogo za izplačilo za leto 2025
- Do zaključka projekta so predvideni še dve vlogi za izplačilo v letu 2025 in ena vloga za izplačilo v letu 2026

EDP	NNO [km]	TP 250 kVA [kos]	TP 400 do 630 kVA [kos]	TP 1000 kVA [kos]	Vrednost sofinanciranja	Realizacija (%)
EL MB	77,51	12	5	10	3.150.323 €	63%
EL LJ	139,66	64	34	30	8.312.469 €	59%
EL CE	141,75	29	40	25	7.381.487 €	72%
EL GO	77,10	0	37	1	3.315.975 €	79%
EL PR	77,66	14	18	4	3.243.959 €	73%
<b>SKUPAJ</b>	<b>508,80</b>	<b>118</b>	<b>126</b>	<b>72</b>	<b>25.404.214 €</b>	<b>67%</b>

ocenjena realizacija razpisa JR NOO DIST EE 2023



## / JR NOO - DIST EE 2024 - MEJNIKI

- Uspešna prijava vseh EDP na drugi razpis do 6.11.2024
- V mesecu februarju smo vse EDP prejele sklepe o ugoditvi vlog na drugem razpisu
- V teku je podpis pogodb posameznih EDP z Ministrstvom za okolje, energijo in podnebje

# / JR NOO - DIST EE 2024

- Višina dodeljenih sredstev za drugi razpis – 33.513.159 €
- Mejniki za izpolnitev pogodbe je izgradnja upravičenih enot do 31.3.2026

EDP	NNO [km]	TP 250 kVA [kos]	TP 400 do 630 kVA [kos]	TP 1000 kVA [kos]	Vrednost sofinanciranja
EL MB	184,00	58	30	30	11.354.778 €
EL LJ	84,40	18	23	13	5.244.945 €
EL CE	77,70	11	26	13	4.903.526 €
EL GO	82,27	3	42	8	5.099.494 €
EL PR	113,32	24	37	12	6.910.417 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>541,69</b>	<b>114</b>	<b>158</b>	<b>76</b>	<b>33.513.159 €</b>

zagotovljena sredstva razpisa JR NOO - DIST EE 2024



# / JR NOO - DIST EE 2024 – REALIZACIJA

- Predvidena oddaja treh vlog za izplačilo v letu 2025 in ene vloge za izplačilo v letu 2026

EDP	NNO [km]	TP 250 kVA [kos]	TP 400 do 630 kVA [kos]	TP 1000 kVA [kos]	Vrednost sofinanciranja	Realizacija (%)
EL MB	55,10	9	0	10	3.029.597 €	27%
EL LJ	15,77	0	1	3	848.738 €	16%
EL CE	36,60	6	1	0	1.676.626 €	34%
EL GO	20,20	1	2	2	1.027.143 €	20%
EL PR	22,88	13	9	6	1.804.979 €	26%
<b>SKUPAJ</b>	<b>150,55</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>8.387.083 €</b>	<b>25%</b>

ocenjena realizacija razpisa JR NOO - DIST EE 2024

# / ZELENI PREHOD

- Višina dodeljenih sredstev na oba razpisa skupaj – 71.005.886 €
- Ocena realizacije obeh razpisov skupaj – 33.791.297 €

EDP	NNO [km]	TP 250 Kva [kos]	TP 400 do 630 kVA [kos]	TP 1000 kVA [kos]	Vrednost sofinanciranja	Realizacija (%)
EL MB	132,62	21	5	20	6.179.920 €	38%
EL LJ	155,43	64	35	33	9.161.207 €	48%
EL CE	178,35	35	41	25	9.058.113 €	60%
EL GO	97,30	1	39	3	4.343.118 €	47%
EL PR	100,54	27	27	10	5.048.938 €	44%
<b>SKUPAJ</b>	<b>664,08</b>	<b>151</b>	<b>148</b>	<b>91</b>	<b>33.791.297 €</b>	<b>48%</b>

ocenjena realizacija razpisov JR NOO - DIST EE



## / TVEGANJA

- Močno povečan obseg del
- Kratek časovni rok za dosego ciljev

## / REŠITVE

- Pravočasno planiranje
- Izvedba skupnih naročil vseh EDP za dobavo blaga
- Povečanje obsega del z iskanjem zunanjih izvajalcev



# REPowerEU 3.0



Financira  
Evropska unija  
NextGenerationEU



NAČRT ZA  
OKREVANJE  
IN ODPORNOST





## / JR REPWR – DIST EE

- Uspešna prijava vseh EDP na razpis do 4.3.2025
- Mejniki za izpolnitev pogodbe je izgradnja upravičenih enot do 31.3.2026

EDP	SNO [km]	Vrednost sofinanciranja
EL MB	59,75	3.769.339 €
EL LJ	79,85	4.750.774 €
EL CE	59,71	2.695.515 €
EL GO	35,90	1.784.982 €
EL PR	43,88	3.125.644 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>279,09</b>	<b>16.129.254 €</b>

ocenjena sredstva razpisa REPowerEU



# Evropska sredstva 4.0



Financira  
Evropska unija  
NextGenerationEU



NAČRT ZA  
OKREVANJE  
IN ODPORNOST





## / ZAGOTOVITEV SREDSTEV

- Lastna sredstva EDP, namenjena investicijskim vlaganjem v omrežje so omejena
- Črpanje sredstev iz razpisov je odlična priložnost za uresničitev ciljev
  - Modernizacijski sklad (95.700.000 €)
  - Preostanek sredstev Zelenega prehoda (~9.000.000 €) in REPowerEU (~4.000.000 €)
  - Kohezija (17.000.000 €)
- Aktivno sodelovanje EDP z Ministrstvi in drugimi deležniki

# HVALA ZA POZORNOST

GIZ projektna skupina za operativno izvedbo NOO

