

17. konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED

17th Conference of Slovenian Electric Power Engineers CIGRE-CIRED


Načrt za okrevanje in odpornost – aktivnosti na ravni distribucije električne energije

CIRED ŠK 5-230

A. Vilman¹, R. Ponebšek², J. Podjaveršek³, A. Koren⁴, D. Čatić⁵

¹ Elektro Gorenjska, d.d. ² Elektro Ljubljana, d.d. ³ Elektro Celje, d.d. ⁴ Elektro Primorska, d.d. ⁵ Elektro Maribor, d.d.

Načrt za okrevanje in odpornost - NOO

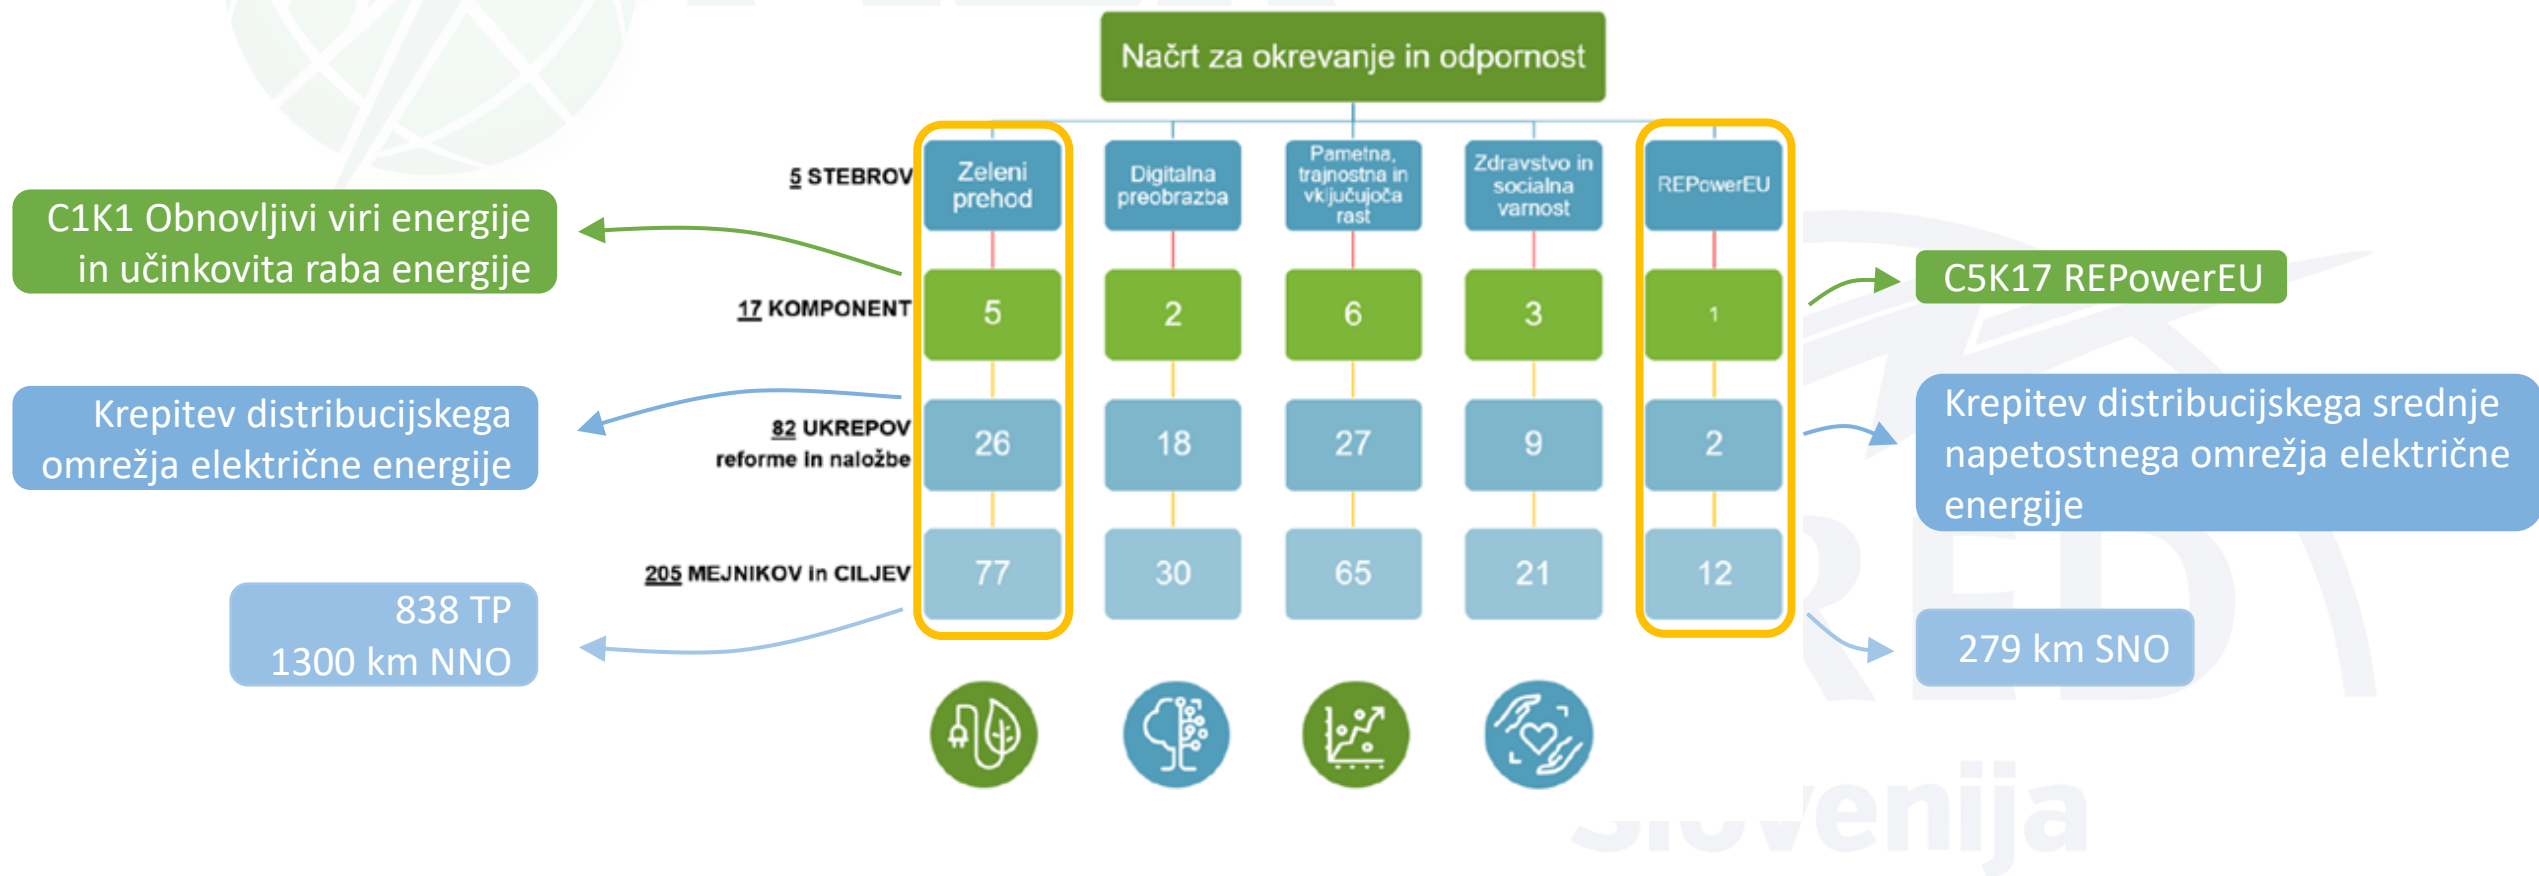

Zeleni prehod

- Znotraj stebra Zeleni prehod je MOPE objavilo dva javna razpisa:
 - JR NOO DIST EE 2023 (april 2023) – pogodba marec 2024 in
 - NOO – DIST EE 2024 (september 2024) – pogodba april 2025.
- Projekta skupina NOO – REPower – MO je pripravila vso potrebno dokumentacijo za prijavo in VZI.
- Dodeljeno število upravičenih enot predstavlja mejnik in cilj, ki ga je potrebno doseči do zaključka projekta 30.6.2026.

JR NOO DIST EE 2023

Dodeljena sredstva po JR NOO DIST EE 2023 [vir: podatki EDP].

EDP	NNO [km]	TP 250 kVA [kos]	TP 400 do 630 kVA [kos]	TP 1000 kVA [kos]	Vrednost sofinanciranja
EL MB	94,00	23	23	15	4.770.112,00 €
EL LJ	288,70	74	71	41	13.865.216,00 €
EL CE	200,53	41	56	32	10.205.613,00 €
EL GO	86,70	1	52	2	4.151.473,00 €
EL PR	91,00	19	30	10	4.500.313,00 €
SKUPAJ	760,93	158	232	100	37.492.727,00 €

Skupna prijavljena realizacija JR NOO DIST EE 2023 (VZI-1, VZI-2, VZI-3 in VZI-4) [vir: podatki EDP].

EDP	NNO [km]	TP 250 kVA [kos]	TP 400 do 630 kVA [kos]	TP 1000 kVA [kos]	Vrednost sofinanciranja	Celotna vrednost	Realizacija (%)
EL MB	77,51	12	5	10	3.150.323,00 €	8.088.802,64 €	66%
EL LJ	139,66	64	34	30	8.312.469,20 €	20.689.213,74 €	60%
EL CE	141,75	29	40	25	7.381.487,40 €	15.235.021,00 €	72%
EL GO	77,10	0	37	1	3.315.975,00 €	7.780.824,00 €	80%
EL PR	77,66	14	18	4	3.243.959,20 €	5.818.395,06 €	72%
SKUPAJ	513,53	119	134	70	25.404.213,80 €	58.353.234,44 €	68%

NOO – DIST EE 2024

Dodeljena sredstva po NOO – DIST EE 2024 [vir: podatki EDP].


EDP	NNO [km]	TP 250 kVA [kos]	TP 400 do 630 kVA [kos]	TP 1000 kVA [kos]	Vrednost sofinanciranja
EL MB	184,00	58	30	30	11.354.778,00 €
EL LJ	84,40	18	23	13	5.244.945,00 €
EL CE	77,70	11	26	13	4.903.525,50 €
EL GO	82,27	3	42	8	5.099.494,05 €
EL PR	113,32	24	37	12	6.910.416,73 €
SKUPAJ	541,69	114	158	76	33.513.159,28 €

Skupna prijavljena realizacija NOO – DIST EE 2024 (VZI-1) [vir: podatki EDP].

EDP	NNO [km]	TP 250 kVA [kos]	TP 400 do 630 kVA [kos]	TP 1000 kVA [kos]	Vrednost sofinanciranja	Realizacija (%)
EL MB	55,10	12	1	16	3.449.435,50 €	30%
EL LJ	22,81	5	5	9	1.687.197,15 €	32%
EL CE	35,65	4	2	4	1.842.669,60 €	38%
EL GO	21,75	2	2	5	1.277.246,71 €	25%
EL PR	26,73	13	10	8	2.102.580,11 €	30%
SKUPAJ	162,04	36	20	42	10.359.129,06 €	31%

Zeleni prehod

■ Vrednost sofinanciranja ■ Vrednost sofinanciranja ■ Realizacija %

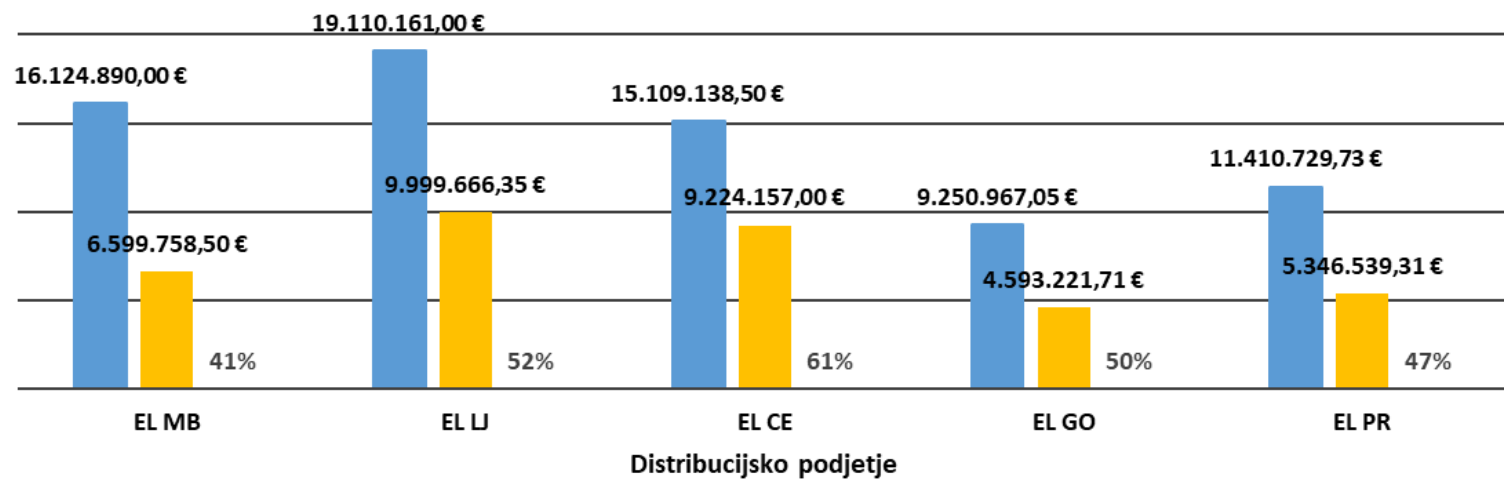

EDP	NNO [km]	kVA [kos]	do 630 kVA [kos]	kVA [kos]	Vrednost sofinanciranja	Realizacija (%)
EL MB	132,61	24	6	26	6.599.758,50 €	41%
EL LJ	162,47	69	39	39	9.999.666,35 €	52%
EL CE	177,40	33	42	29	9.224.157,00 €	61%
EL GO	98,85	2	39	6	4.593.221,71 €	50%
EL PR	104,39	27	28	12	5.346.539,31 €	47%
SKUPAJ	675,57	155	154	112	35.763.342,86 €	50%

REPowerEU

- Znotraj stebra REPowerEU je MOPE objavilo JR REPWR – DIST EE 2024 (rok za prijavo 4.3.2025 – EDP prejele sklepe v prejšnjem tednu).

Predvidena dodeljena sredstva po JR REPWR – DIST EE 2024 [vir: podatki EDP].

EDP	SNO [km]	Vrednost sofinanciranja
EL MB	59,75	3.769.338,81 €
EL LJ	79,85	4.750.744,00 €
EL CE	59,70	2.641.905,00 €
EL GO	35,90	1.784.982,00 €
EL PR	43,80	3.123.515,00 €
SKUPAJ	279,00	16.070.484,81 €

Tveganja

- Veliko število projektov v relativno kratkem času.
- Pravočasno zagotavljanje projektne dokumentacije.
- Umeščanje v prostor in postopki pridobivanja gradbenih dovoljenj.
- Povečanje potreb po materialu in storitvah.
- Nepravočasna izvedba projektov.

Zaključki

- Za koordiniran pristop k aktivnostim za pripravo in prijave na razpise uspešno skrbi projektna skupina NOO – REPower – MO.
- Znotraj skupine ves čas poteka aktivno obveščanje in izmenjava vseh aktualnih informacij.
- Skupina skrbi za uspešno črpanje sredstev in bližanje mejnikom in ciljem, katere je potrebno doseči ob zaključku projekta.



cigre

Hvala za pozornost.

Slovenija

Vprašanja???



Slovenija
